



施工報告書

SERVICE REPORT

報告書番号: GH-2026-0417

作成日: 2026年4月18日

サンプル食堂 本店 御中

平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

下記の通り、施工内容をご報告申し上げます。

お客様	株式会社サンプルフーズ サンプル食堂 本店
施工日	2026年4月17日（金）
作業時間	23:30 ~ 翌 04:50
サービス種別	厨房定期清掃（ダクト・フード／グリストラップ／床・排水溝）
担当者	作業責任者 田中 健一 ほか2名

作業内容

閉店後に入館し、厨房設備の定期清掃を実施いたしました。

レンジフードは整流板およびグリスフィルターを取り外し、薬剤槽への浸け置きの際高圧洗浄を行いました。ダクト内部は点検口から到達できる範囲を洗浄し、送風ファンは羽根を分解して油分を除去しております。

グリストラップはバスケットの残渣、浮上油脂、底部の汚泥をすべて回収し、槽内壁面の油膜まで落としました。回収物は産業廃棄物として適正に処理し、マニフェストを別紙にて発行しております。

床および排水溝は高圧洗浄のうえ、グレーチングを外して溝内の堆積物を除去いたしました。

所見・次回のご提案

ダクト内部の油分は前回（1月）より蓄積が進んでおりました。揚げ物の提供数が増えているとのことでしたので、次回より清掃の間隔を4ヶ月から3ヶ月へ短縮することをご提案いたします。

グリストラップのバスケットに残渣が多く溜まっておりました。営業終了時に取り除いていただくと、臭気の発生と当社の作業時間の双方が抑えられます。やり方は店長様へ口頭にてご説明済みです。

厨房奥の壁面コーキングに剥離を確認いたしました。清掃の範囲外となりますが、水の侵入が進むと害虫の侵入経路になります。早めのご対応をおすすめいたします。

担当
田中 健一






施工箇所（ビフォー・アフター） 1 / 2

施工箇所 #01 | グリスフィルター




施工箇所 #02 | レンジフード内部

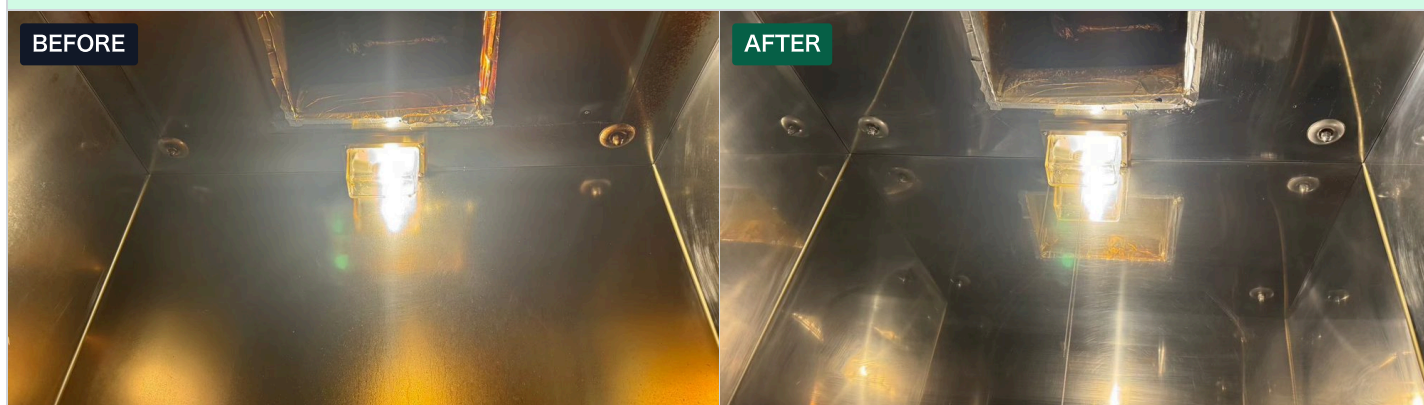



施工箇所（ビフォー・アフター） 2 / 2

施工箇所 #03 | フードの整流板・油受け

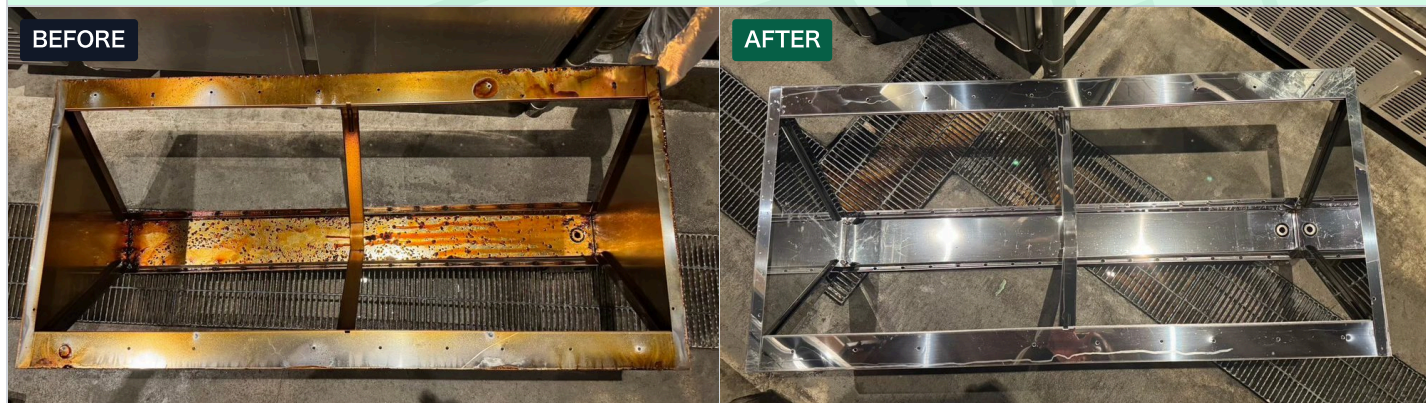

施工箇所 #04 | 側溝グレーチング

